

Sunline[®] Die smarte, integrierte Absturzsicherung


Wichtiges Dokument (Bedingung für Endmontage Repapress)

Um eine reibungslose Montage der Absturzsicherung zu garantieren und unnötige Mehrkosten zu verhindern, benötigen wir vor der Terminfindung für den Seileinzug von Repapress folgende Informationen:

☐ Korrekte Montage der Klemmplatten

Wir bestätigen, dass sämtliche Klemmplatten an den jeweils **ballastierten** (und in der Regel unteren, **rechtwinklig zum Panelen-First verlaufenden**) Novotegra Grundschienen befestigt sind.

Falsch montierte Klemmplatten (z.B., wenn auf Querschienen montiert, s. Bild unten rechts) werden von Repapress AG demontiert und korrekt befestigt. Die daraus folgenden Mehraufwände und allenfalls zusätzlichen Anfahrtskosten werden entsprechend verrechnet.

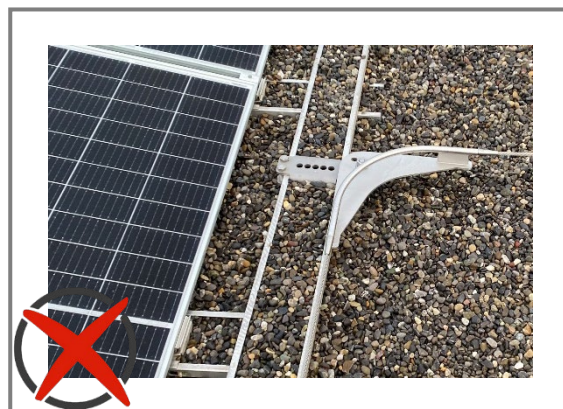

☐ Korrekte Ballastierung

Wir bestätigen, dass die Ballastierung der PVA den Anweisungen in der Montagedokumentation entspricht. Die Ballastierung von jeweils 600 kg inkl. UK/PVA (z.B. 24 Gartenplatten @22 kg), **konzentriert sich auf die Anfangs-, End- und Einzelanschlagpunkte sowie auf die Kurvenelemente**. Die Ballastierung ist bei allen oben erwähnten Anschlagpunkten jeweils unter 4 gekoppelten Panelen verteilt oder die Ballastierung (wenn über 4 Panelen hinaus) erfolgte in dokumentierter Absprache mit Repapress AG.

Kommission / Auftragsnummer: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____

Bitte senden sie dieses Formular per Email an: solar@repapress.ch.

Besten Dank für Ihre Zusammenarbeit.
Ihr Repapress Team
